

Obra de Reforma do Telhado do Prédio da Câmara Municipal de Piraí

OBJETO DA CONTRATAÇÃO	MODALIDADE	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	DATA DO CERTAME	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	VALOR TOTAL PREVISTO
Licitação para contratação de empresa para a execução da Obra de Reforma do Telhado do Prédio da Câmara Municipal de Piraí.	CONVITE Nº 08/2022	11/2023	Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-96	22/03/2022	06/03/2023	R\$ 344,335,50

APOSTILAMENTO	R\$ 30,00	VALOR TOTAL PREVISTO + APOSTILAMENTO	R\$ 344,365,53
---------------	-----------	--------------------------------------	----------------

	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL PREVISTO + APOSTILAMENTO + ADITIVO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	R\$ 19.969,81	-R\$ 2.263,13	R\$ 17.706,68	R\$ 349.044,54
4ª MEDIÇÃO	-	-R\$ 13.027,68	-R\$ 13.027,68	


Execução da Obra de Reforma do Telhado do Prédio da Câmara Municipal de Piraí.

FASES	RESUMO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	INÍCIO DA MEDIÇÃO	FINAL DA MEDIÇÃO	VALOR TOTAL PREVISTO + APOSTILAMENTO + ADITIVO	PAGAMENTOS REALIZADOS
1ª MEDIÇÃO	Retirada do forro do 3º andar; Montagem e instalações dos perfis UE; Pintura com zarcão dos perfis UE; Montagem e instalação de pontaletes nas treliças;	11/2023	Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-97	02/05/2023	31/05/2023	R\$ 349.044,54	R\$ 22.202,34
2ª MEDIÇÃO	Inversão da estrutura da cobertura; Retirada das telhas antigas; Continuação da instalação dos perfis UE; Instalação das telhas novas; Retirada de entulho; Instalação da calha; Troca da tubulação da caixa d'água;	11/2023	Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-98	01/06/2023	30/06/2023	R\$ 349.044,54	R\$ 56.683,97


	Retirada da escadaço da caixa d'água;						
3ª MEDIÇÃO	Retirada de entulho e limpeza da obra; Instalação do forro em drywall; Acerto do gesso; Calafetagem e emassamento; Início da pintura e emassamento do teto e paredes do 3º andar;	11/2023	Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-99	02/07/2023	31/07/2023	R\$ 349.044,54	R\$ 144.778,28
4ª MEDIÇÃO	Pintura dos forros; Limpeza de janelas; Fixação de metalon nos forros restantes; Arremate externo e preparação das paredes para pintura; Selagem da laje da cozinha; Limpeza das salas; Emassamento do teto; Rapagem da parede e aplicação de massa em salas do 2º andar; Fixação de luminárias; Arremate externo e travamento da torre da caixa d'água; Fixação de sanca na porta do elevador no 3º andar; Fixação de placa junta militar; Impermeabilização dos parafusos do telhado; Remoção de material da obra; Montagem de andaime; Montagem de estrutura para o forro no vão do elevador; Montagem de forro no vão do elevador;	11/2023	Amanda Pinto Ferreira Serviços LTDA. CNPJ nº 43.784.183/0001-99	01/08/2023	30/08/2023	R\$ 349.044,54	R\$ 125.379,95
						TOTAL LIQUIDADO =	R\$ 349.044,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
EXECUÇÃO DA OBRA	FASES	PRAZOS	PREVISÃO	EXECUTADO
	1ª ETAPA	30 (trinta) dias	6,55%	6,45%
	2ª ETAPA	60 (sessenta) dias	16,47%	16,46%
	3ª ETAPA	90 (noventa) dias	42,09%	42,04%
	4ª ETAPA	120 (cento e vinte) dias	34,89%	35,05%
	TOTAL=		100%	100,00%

VALOR PREVISTO + APOSTILAMENTO POR FASES DA OBRA

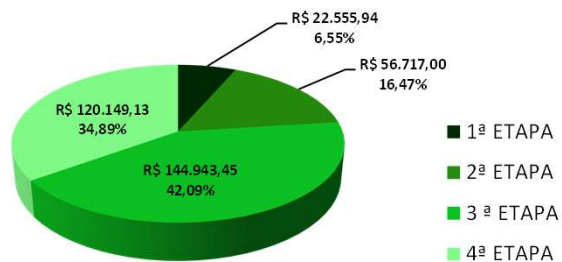

% DE CONCLUSÃO POR FASE DA OBRA

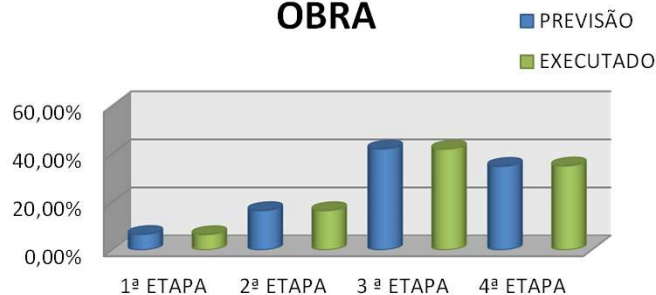

% DE CONCLUSÃO TOTAL DA OBRA:

